

**BANDE DE TAPIS MAGIQUE SUN KID
SKD15 - 2010**



**LISTE DE CONTRÔLE QUOTIDIENNE PENDANT
100 JOURS D'OPÉRATION**

SunKid GmbH
A - 6460 Imst/Tirol
Tel (+43) 05412.68131
Fax (+43) 05412.68132
e-mail: office@sunkid.at
Website: www.sunkid.at
UID-Nr: ATU42030100

SAISON FONCTIONNANTE

PROPRIÉTAIRE:

TYPE: LENGTH: LONGUEUR:

ANNÉE DE
FABRICATION:

SI PROBLÈMES - CONTACT:

TRAVAUX D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRES:

(Tous les 7 jours, lorsque l'installation n'est pas en service)

- Nettoyer avec soin la neige et la glace accumulées sous la courroie et sur les côtés.
- Contrôle du dispositif de serrage lors du changement de direction – contrôler la tension de la chaîne – si formation d'un toit après l'entraînement – resserrer la chaîne. Il est possible d'obtenir une tension de la chaîne plus importante en remplaçant la console sur laquelle les caoutchoucs de serrage sont fixés. Contrôler si ces derniers sont endommagés. Les caoutchoucs de serrage ne doivent pas présenter de fissures.
- Veiller à la marche silencieuse, contrôler la présence de traces d'usure et de zones de friction, vérifier les boulons desserrés. Contrôler le guidage forcé des chaînes lors du retour.

On	Date	Accompli près:
Les problèmes ont entré en contact aux contrôles		

La durée de quotidien "ABC"-vérifiant:
Personne à charge sur la longueur de la Bande : 3 - 5 minutes.
Changement d'huile annuel d'entretien et de vitesse : voir le manuel

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE AVANT LA MISE EN SERVICE
TEST ABC
1A. Test du volet de commutation

Avec l'auriculaire, vérifiez que le volet de commutation fonctionne. Celui-ci doit se déclencher lorsque l'interstice atteint 20 mm au maximum puis provoquer l'ouverture complète. En cours de fonctionnement, il doit, dans la mesure du possible, bien se fermer et ne pas être givré (s'applique avec l'option « sortie latérale »).

2. Test de l'arrêt d'urgence :

Testez le fonctionnement de la totalité des dispositifs d'arrêt. La bande doit immédiatement s'immobiliser !

3. Test du volet d'urgence

Si le volet d'urgence est placé à plus de 30 mm de sa position de base, l'installation doit s'immobiliser. Maintenir la zone sous le volet d'urgence exempte de neige.

4. Test de la porte de sécurité (avec l'option sortie latérale) – doit se déclencher suite à un déplacement d'au max. 15 mm puis s'ouvrir d'au moins 300 mm. Ne doit pas être givré, et doit pouvoir être facilement actionnée avec le pouce. Après l'arrêt, le tapis roulant ne doit pas continuer à se déplacer de plus. 20 cm max. Test de toutes les touches d'arrêt – contrôler à nouveau le déplacement après l'arrêt.

B Contrôle de la surface du tapis :

- Lui faire faire un tour complet. Le tapis doit former une surface fermée.
- Vérifier qu'il se déroule sans accrocs ni défaillance et de manière centrée.
- Vérifier que le scellement de la bande n'est pas endommagé. L'extrémité recourbée de la jarrettière doit aller dans le sens contraire au mouvement de l'installation et se trouver à l'intérieur des bords du tapis.
- La jonction avec la surface enneigée dans la zone d'entrée et de sortie ne doit comporter aucun orifice ni aucun interstice et doit présenter une légère inclinaison.
- Éliminer la neige accumulée sous l'entrée de la bande et dans les angles, si nécessaire.
- La bande ne doit pas être givrée ; cela pourrait provoquer une chute en arrière des passagers.
- Toutes les protections doivent se trouver dans la position adéquate.
- Contrôler les points d'appui de la bande de convoyage. La structure ne doit pas se balancer ni être instable au moment d'entrer. L'installation doit être déconnectée lorsque la construction est glissante ou inclinée transversalement et n'est plus stable.

C Barrière photoélectrique « œil du tapis magique » (s'applique avec l'option « sortie latérale »)

Test : recouvrir la source de lumière : le tapis doit s'immobiliser après 3 secondes.

MESURES

Lorsque les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas ou que la surface de la bande est endommagée, **immédiatement cesser l'activité** et faire réparer par un personnel qualifié.

En cas de désactivation temporaire de la barrière photoélectrique, la zone d'entrée doit directement être inspectée et il doit être garanti qu'en cas de chute, l'installation soit mise à l'arrêt dans les plus brefs délais.


En cas de forte chute de neige, de conditions extrêmes (p. pluie verglaçante), ce contrôle doit être effectué plus souvent, toutes les heures par exemple. En situation extrême, une surveillance et un entretien permanents de la zone de sortie et d'accès sont nécessaires.

LISTE DE CONTRÔLE :

1. Lorsque le volet de commutation est enclenché, la bande doit s'arrêter après avoir parcouru une distance max. de 20 mm.
2. Ouverture du volet de commutation de 60 mm.
3. L'interstice entre la courroie de convoyage et la protection doit être de 6 mm au maximum et 1 mm au minimum.
4. Contrôler le fonctionnement de toutes les touches d'arrêt d'activité et d'urgence.
5. Le distance parcourue après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité ne doit pas dépasser 20 cm (porte de protection : 30 cm max.).
6. Contrôler la surface totale de la bande ; elle ne doit pas être endommagée.
7. Les extrémités de la jarrettière doivent être recourbées à angle droit dans le sens contraire au mouvement de l'installation et ne doit pas dépasser la largeur des bords du tapis roulant.
8. Si la barrière photoélectrique est recouverte, la bande doit s'arrêter après 3 secondes.



**TOUT ENDOMMAGEMENT DOIT IMMÉDIATEMENT ÊTRE RÉPARÉ !
DANS LE CAS CONTRAIRE, DE GRAVES ACCIDENTS IMPLIQUANT DES BLESSURES RISQUENT DE**

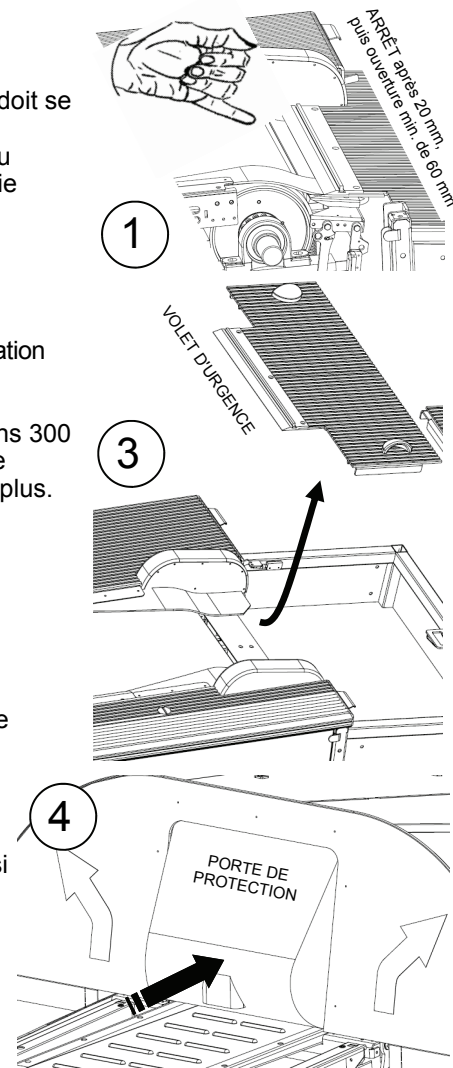

Si approuvé ✓	Avant utilisation			Avant l'opération d'après-midi (après 3 h)			C* Option Barriere lumineuse	Si approuvé ✓	Avant utilisation			Avant l'opération d'après-midi (après 3 h)			C* Option Barriere lumineuse	
	Date	A	B	C*	A	B	C*		Signature Nommée d'Appareil de contrôle	Date	A	B	C*	A	B	C*

Problèmes:
Date:

Si approuvé ✓	Avant utilisation			Avant l'opération d'après-midi (après 3 h)			C* Option Barrière lumineuse Signature Nommée d'Appareil de contrôle
	A	B	C*	A	B	C*	
Date							

Si approuvé ✓	Avant utilisation			Avant l'opération d'après-midi (après 3 h)			C* Option Barrière lumineuse Signature Nommée d'Appareil de contrôle
	A	B	C*	A	B	C*	
Date							

Problèmes:
Date:
